

## ARTECADRE Ouvrage routier

MOROGES

RCEA - Passage inférieur & ouvrage piéton de Montée  
Saône et Loire (71)



### LE PROJET :

- **Maître d'ouvrage** : Direction Régionales de l'Équipement de Bourgogne
- **Maître d'œuvre** : Direction Interdépartementales des Routes Centre Est
- **Entreprise mandataire** : BEC
- **Entreprise de pose** : BEC
- **Usines BONNA SABLA** : Apremont (70), Vendargues (34)
- **Caractéristiques du projet et date** : 6 ouvrages pour doublement RCEA entre Moroges et St Désert. Demis ouvrages PI posés en juillet 2008 et mai 2009, demis ouvrages piétons posés en Octobre 2008 et Mai 2009.
- **Prestation BONNA SABLA** : Etudes d'exécution complètes ( Note de calcul, plan de coffrage et de ferrailage). Préfabrication et livraison des éléments.

### ■ Caractéristiques de l'ouvrage

- Type d'ouvrage : Piédroits, dalles, voiles, cadres
- Longueur : 2 x 13 m
- Hauteur gabarit : 6 m. Ouverture du PI : 5 m. Cadres section 3.00 x 3.00
- Voiles matricés hauteur 7 m
- Béton préfabriqué : 500 T.


### ■ Spécificités de l'ouvrage

- 24 piédroits, 12 dalles supérieures d'ouvrage, 12 voiles, 14 cadres
- Délai de fabrication en usine : 3 semaines pour le PI, 2 semaines pour l'ouvrage piéton
- Délai de pose de l'ouvrage : 1 semaine pour les demis PI, 2 jours pour l'ouvrage piéton.
- Murs en aile matricés pour une meilleure intégration architecturale.

■ **Le plus ARTEFAC : Etudes et conception entièrement prises en charge par Bonna Sabla. Délais d'intervention optimisés – pose des 76 pièces : 3 x 1 semaine. Garantie de résultat esthétique pour les murs.**



VUE DE DESSUS DES PIEDROITS

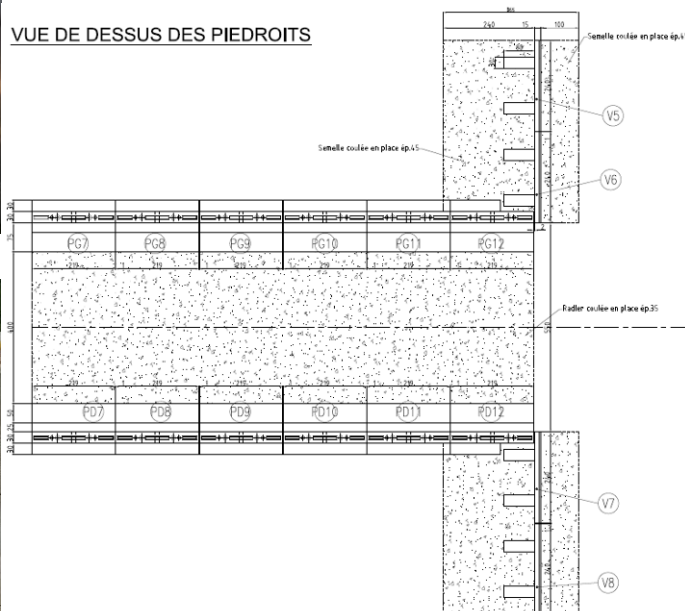

**COORDONNÉES CHARGÉ D'AFFAIRES :**

E-mail : [p.claud@bonnasabla.com](mailto:p.claud@bonnasabla.com)

Tél. : 06 25 97 71 54
