

ARTECADRE Ouvrage routier

MOROGES
RCEA - PI de Mortière
Saône et loire (71)



LE PROJET :

- **Maître d'ouvrage** : Direction Régionales de l'Équipement de Bourgogne
- **Maître d'œuvre** : Direction Interdépartementales des Routes Centre Est
- **Entreprise mandataire** : BEC
- **Entreprise de pose** : BEC
- **Usines BONNA SABLA** : Apremont (70) , Lannemezan (65)
- **Caractéristiques du projet et date** : 6 ouvrages pour doublement RCEA entre Moroges et St Désert. Pose du PI de Mortière en septembre 2008.
- **Prestation BONNA SABLA** : Etudes d'exécution complètes (Note de calcul, plan de coffrage et de ferrailage). Préfabrication et livraison des éléments.



▪ Caractéristiques de l'ouvrage

- Type d'ouvrage : Piédroits, dalles et voiles.
- Ouvrage : section 5.50 x 6.60, longueur 15 ml.
- Murs : hauteur : 7.50 à 8.20 m, 21.60 ml
- Béton préfabriqué 150 m³ soit 374 T

▪ Spécificités de l'ouvrage

- 18 piédroits, 9 dalles supérieures d'ouvrage, 8 voiles.
- Délai de fabrication en usine : 3 semaines
- Délai de pose de l'ouvrage : 1 semaine

▪ **Le plus ARTEFAC : Etudes et conception entièrement prises en charge par Bonna Sabla. Délais d'intervention optimisés – pose des 35 pièces : 1 semaine**

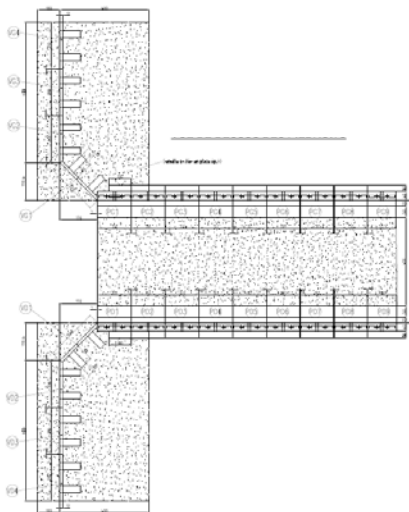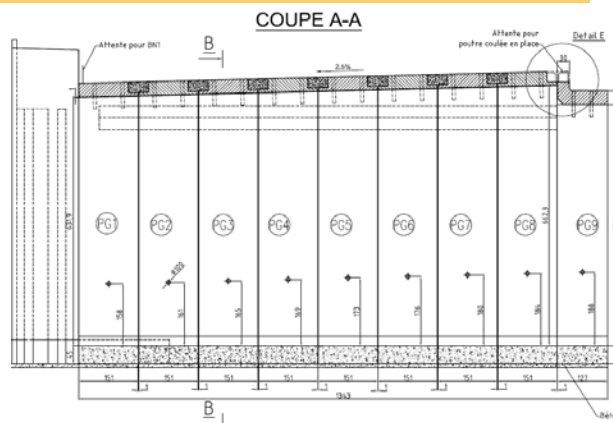

COORDONNÉES CHARGÉ D'AFFAIRES :

E-mail : p.claudel@bonnasabla.com

Tél. : 06 25 97 71 54



BONNA SABLA

L'art de maîtriser l'ouvrage
